7.4. Plazo de ejecución. Plan de obra

Proyecto Básico y de Ejecución de reforma del mercado del Progreso
Situación: Rua do Progreso, 28 A. Concello de Vigo
Promotor: Concello de Vigo


El plazo de ejecución que se propone para la ejecución de la obra de referencia es TRECE (13) meses.

Se adjunta el programa de obra

VIGO, enero de 2010

Fdo: Mercedes Fernández Díaz, arquitecta

PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

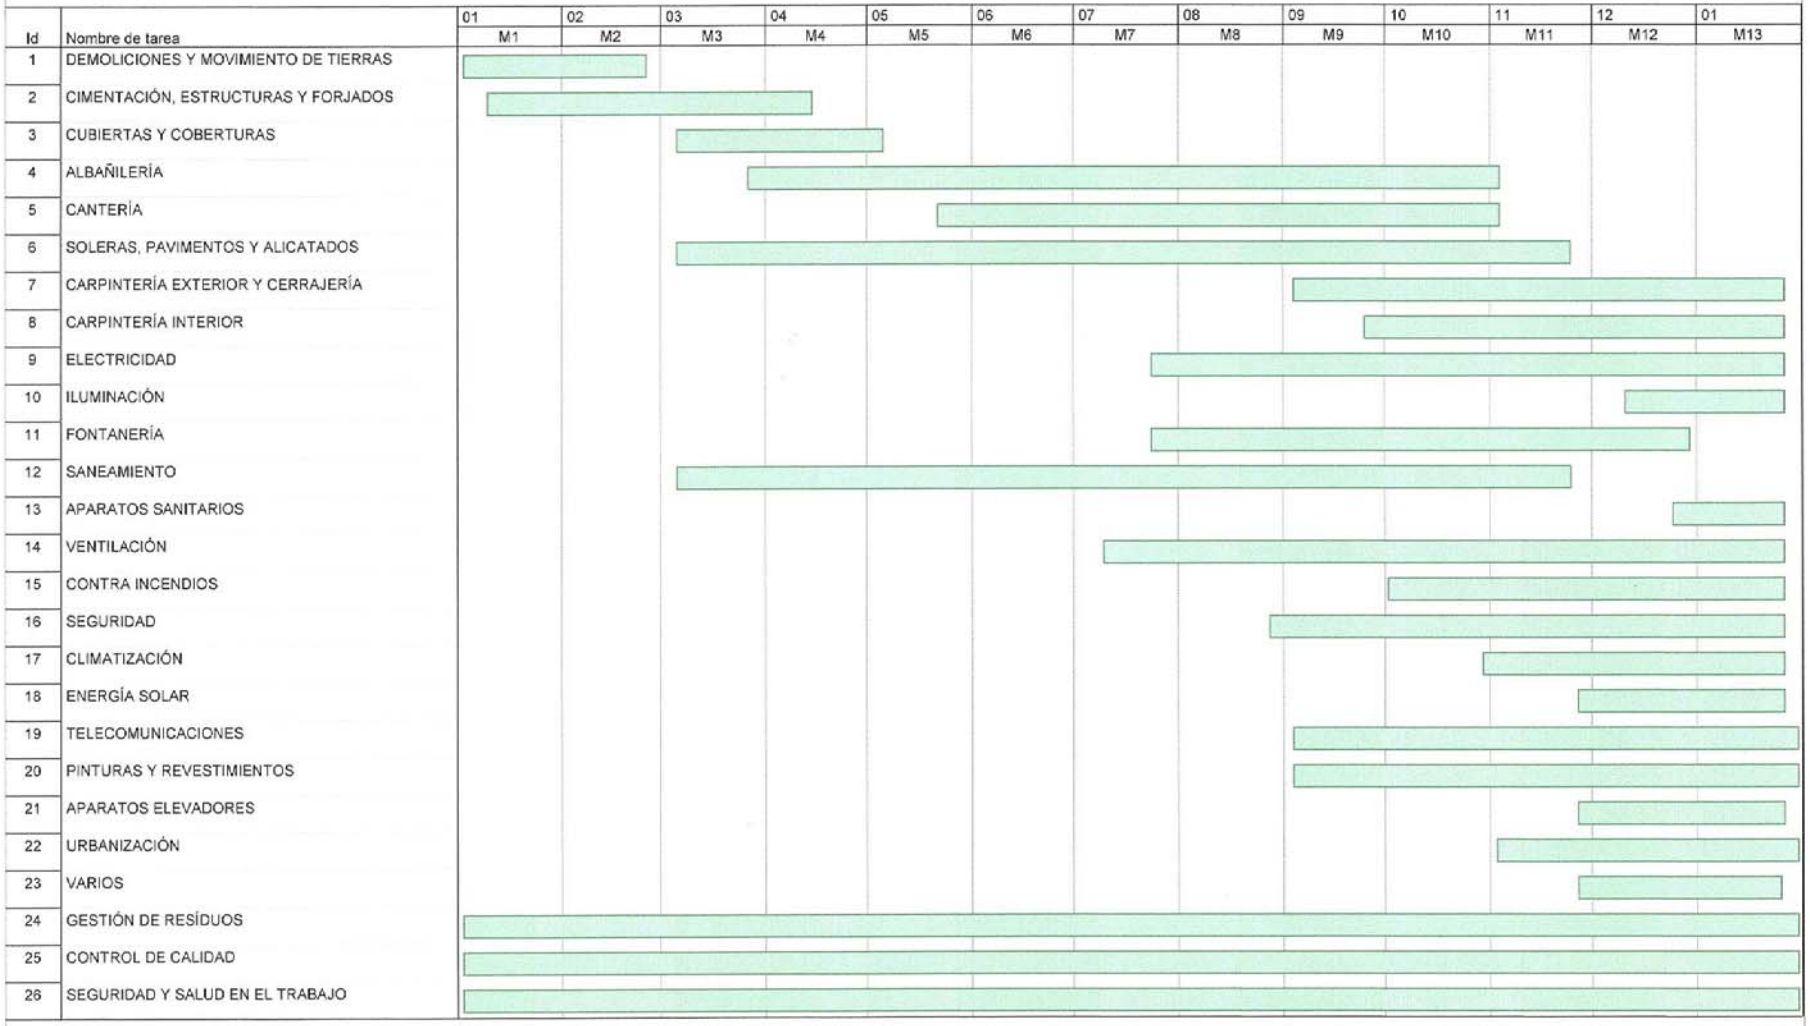

OBRA: **REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO.**
SITUACIÓN: **PLAZA DEL PROGRESO. VIGO. PONTEVEDRA**
PROPIEDAD: **EXCMO. CONCELLO DE VIGO.**
FECHA: **ENERO DE 2.010**

ARQUITECTA :
Fdo.: **Mercedes Fernández Díaz**

COAG 3112
mercedes fernández díaz . arquitecta
